
	RELATÓRIO		RDO-ZBB-001	Sequencial: 12	
	Cliente			CICAP	FOLHA 1.1
	Relatório Semanal de Obra			Data:	
				12/01/2023	
Atividades de recuperação.			Local:	Show Room	


INFORMAÇÕES

*REGISTRO A :Foi dado início à retirada do concreto para verificação da parte íntegra do aço nas figas do fundo.
 REGISTRO B : Foi retirado concreto ruim nas vigas do fundo. Será preciso refazer tubulação aparente para evitar umidade após tratamento. REGISTRO C : Em vários estribos abertos não foi encontrado aço íntegro, sendo assim preciso a troca total. O aço será avaliado por ENSAIO DE POTENCIAL DE CORROSÃO nas demais barras objetivando redução de custos .*

Registro Fotográfico

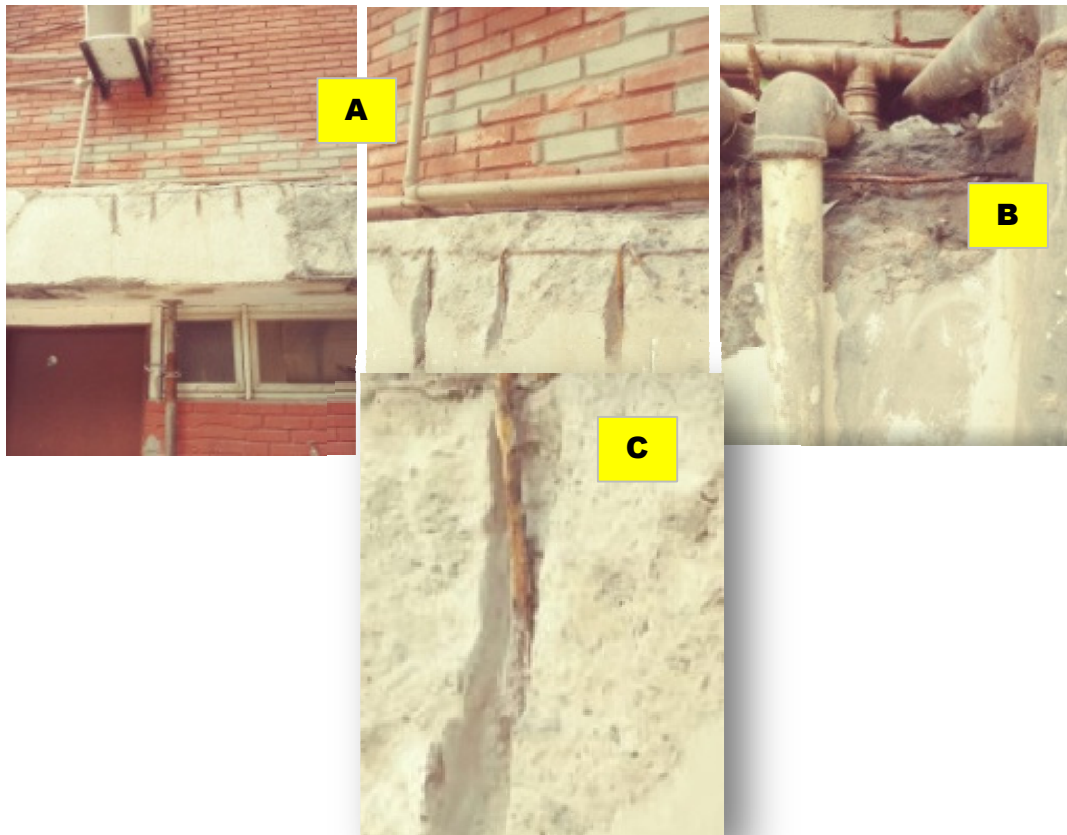

Check List de Obra	Localização.
--------------------	--------------

Foi Verificado EPC	Foi Verificado Limpeza da Área Antes dos Serviços	
x <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	x <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Foi Verificado EPI	Foi Verificado Limpeza da Área Após os Serviços	
x <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	x <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Foi Verificado Condição das Ferramentas?	Foram Feitos os Registros Fotográficos	
x <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	x <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	

Foi Verificada Instalação Elétrica? sim não

Operadores do Dia: **Clebson da Silva Viana**
Jailson Sousa de Almeida

Assinaturas:

<i>Responsável da Obra:</i>	<i>Cliente</i>	<i>Outras assinaturas de interesse:</i>
Eng. Marconi de Andrade Machado CREA- BA:30000611588A		Alexandre B. Almeida Sobral Auditor Líder da Qualidade BVQI Bureau Veritas Quality International

Data: _____ Data: _____ Data: _____
